Durée estimée : 1 jour

5 RUE DU CHAMPS MAILLARD SALLES SUR MER

Réalisation d'un branchement d'eau potable en PEHD DN32 avec pose d'un regard de comptage en domaine public comprenant un 2 compteurs en DN15 sur une longueur de 5 ml pour le compte de M Aksoum

Déroulement et organisation du chantier

** Circulation et Sécurité : La circulation routière sera fermée. Une déviation sera mise en place selon le plan ci-dessous. L'accès jusqu'aux abords du chantier sera maintenu pour permettre accès aux propriétés voisines.*

** Finitions : La réfection de la chaussée (pastille) sera de forme rectangulaire pour garantir un résultat esthétique. Nous utiliserons un Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) adapté de granulométrie 0/10 sous la chaussée.*

Vue aérienne de la localisation chantier

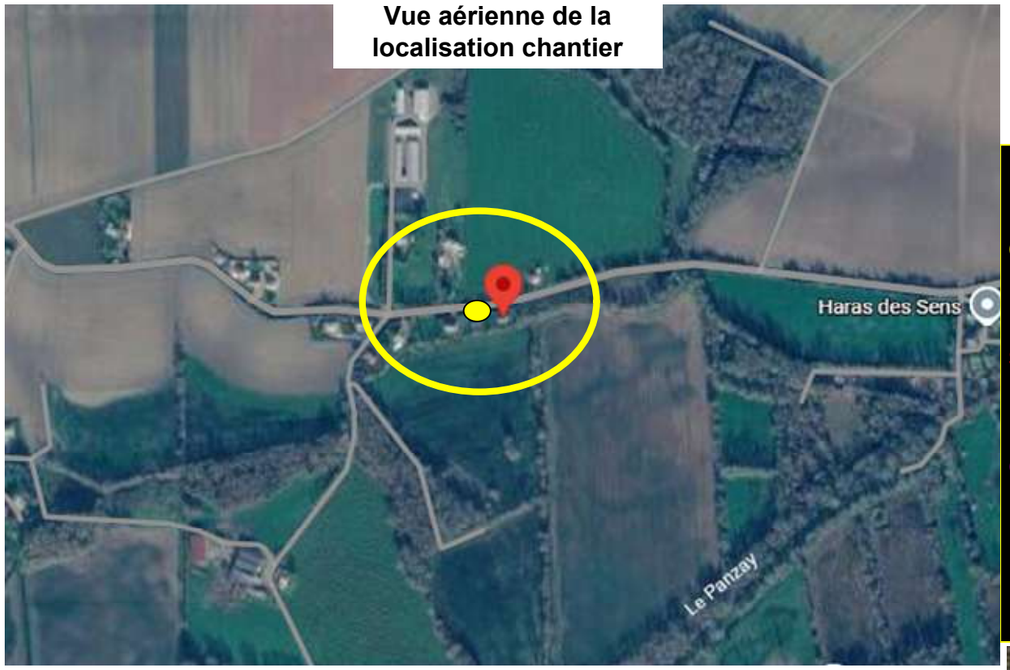

En jaune : Zone de reprise enrobé définitif en BBSG 0/10

En rouge : Zone de stationnement a reserver

En magenta : Zone d'ouverture tranchée

En vert, emplacement du branchement et du regard de comptage

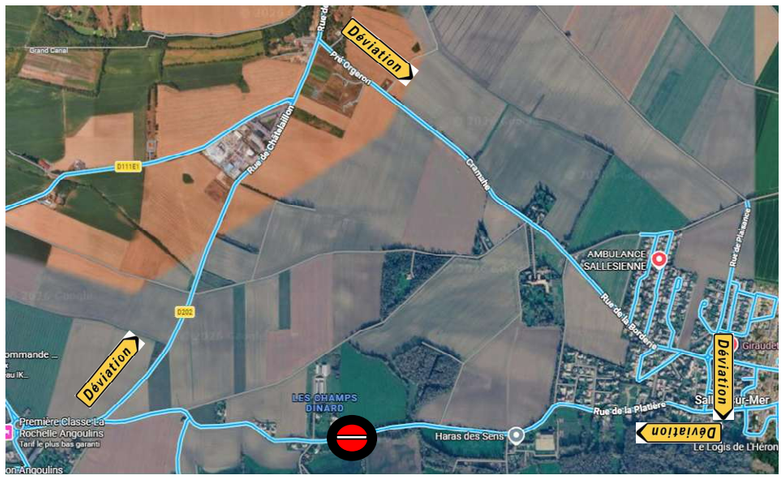
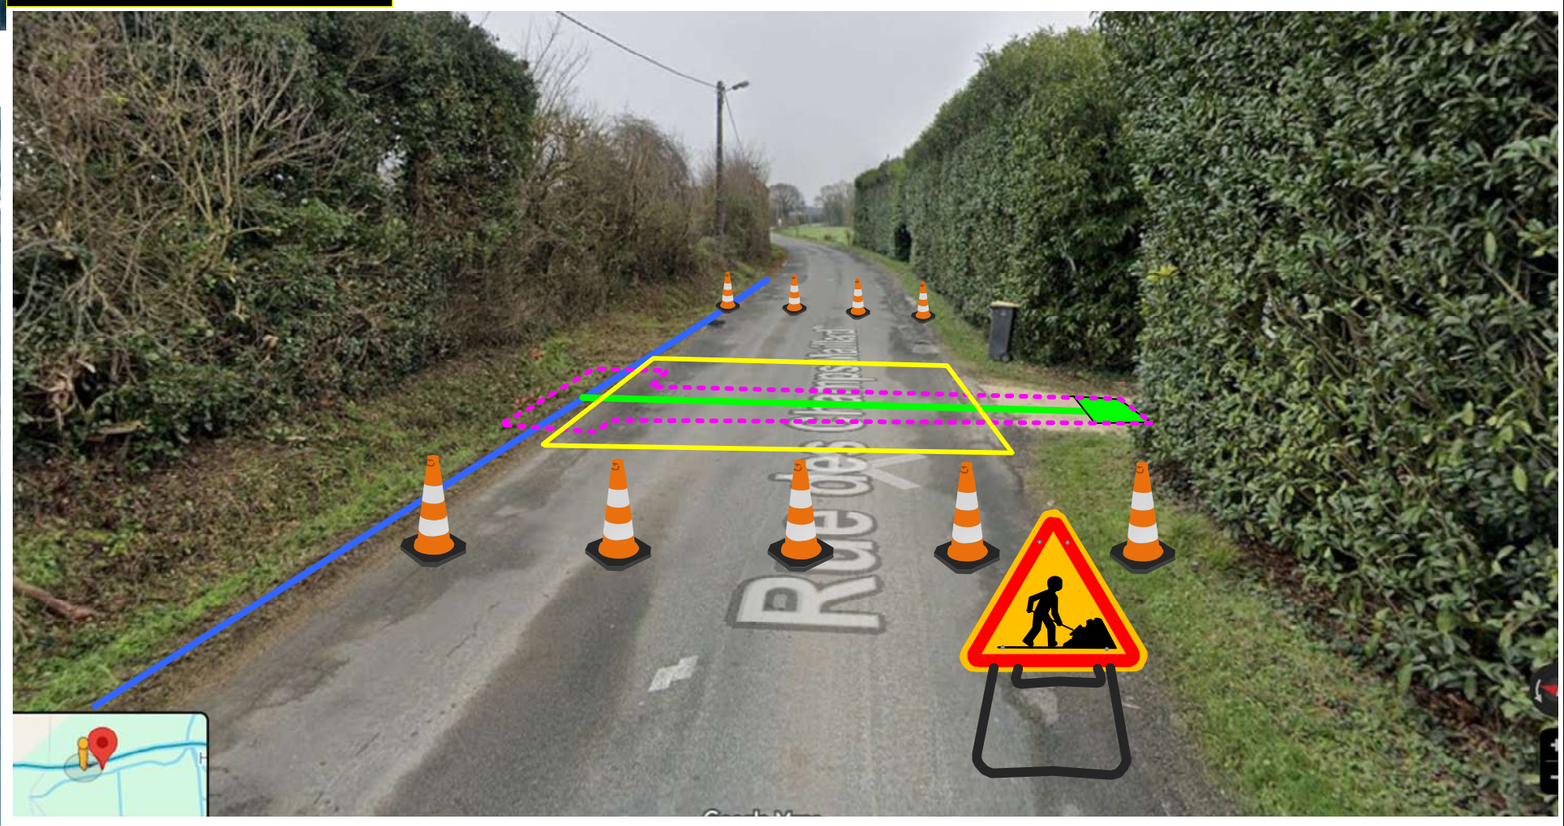
Zoom vue aérienne de la localisation chantier
